
НЕТУ | PR3

	Задача	Исполнитель	Начало	Завершение	Длительно	Трудозатраты	Стоимость
			01-11-2025	**20-03-2026**	800ч	1474ч 11м	15,003.73
1	**Предварительный этап**		**01-11-2025**	**12-11-2025**	**64ч**	**60ч**	**704.00**
1.1	Определение целей	ВЗ	01-11-2025	07-11-2025	48ч	48ч	552.00
1.2	Определение участников проекта	ВЗ Руководитель ...	08-11-2025	11-11-2025	16ч	6ч	90.00
1.3	Разработка устава	ВЗ	08-11-2025	11-11-2025	16ч	6ч	62.00
1.4	Окончание предварительного этапа	не назначен	12-11-2025	12-11-2025			0.00
2	**Проектирование системы**		**12-11-2025**	**03-12-2025**	**120ч**	**120ч**	**1,440.00**
3	**Дизайн**		**03-12-2025**	**24-12-2025**	**120ч**	**112ч**	**1,164.00**
3.1	UX-исследования и прототипы интерфейса	Д Дизайнер	03-12-2025	09-12-2025	40ч	30ч	270.00
3.2	Подтверждение концепции	ВЗ	10-12-2025	11-12-2025	16ч	32ч	384.00
3.3	Разработка визуального дизайна	Д Дизайнер	12-12-2025	18-12-2025	40ч	30ч	270.00
3.4	Техническая спецификация	ВЗ Д	19-12-2025	23-12-2025	24ч	20ч	240.00
3.5	Завершение этапа дизайн	не назначен	24-12-2025	24-12-2025			0.00
4	**Разработка**		**03-12-2025**	**16-01-2026**	**256ч**	**377ч 58м**	**3,779.70**
4.1	Создание БД и базовых сервисов	Р Разработчик 1	03-12-2025	13-12-2025	72ч	47ч 58м	479.70
4.2	Разработка API	Р Разработчик 2	03-12-2025	13-12-2025	72ч	56ч	560.00
4.3	Веб-интерфейс	Р Разработчик 1	13-12-2025	30-12-2025	96ч	72ч	720.00
4.4	Мобильное приложение	Р Разработчик 2	13-12-2025	30-12-2025	96ч	72ч	720.00
4.5	Интеграция с 1С	Р Разработчик 1	31-12-2025	07-01-2026	48ч	40ч	400.00
4.6	Интеграция с ЮКасса	Р Разработчик 2	31-12-2025	07-01-2026	48ч	10ч	100.00
4.7	Интеграция с CRM	Р Разработчик 1	08-01-2026	15-01-2026	48ч	40ч	400.00
4.8	Реализация отчётности и аналитики	Р Разработчик 2	08-01-2026	15-01-2026	48ч	40ч	400.00
4.9	Завершение этапа разработка	не назначен	16-01-2026	16-01-2026			0.00
5	**Тестирование**		**16-01-2026**	**14-02-2026**	**168ч**	**224ч**	**1,968.00**
6	**Внедрение**		**14-02-2026**	**26-02-2026**	**64ч**	**192ч**	**1,872.00**
7	**Завершение проекта**		**26-02-2026**	**20-03-2026**	**128ч**	**388ч 13м**	**4,076.03**



Загрузка ресурсов

Часы Задачи

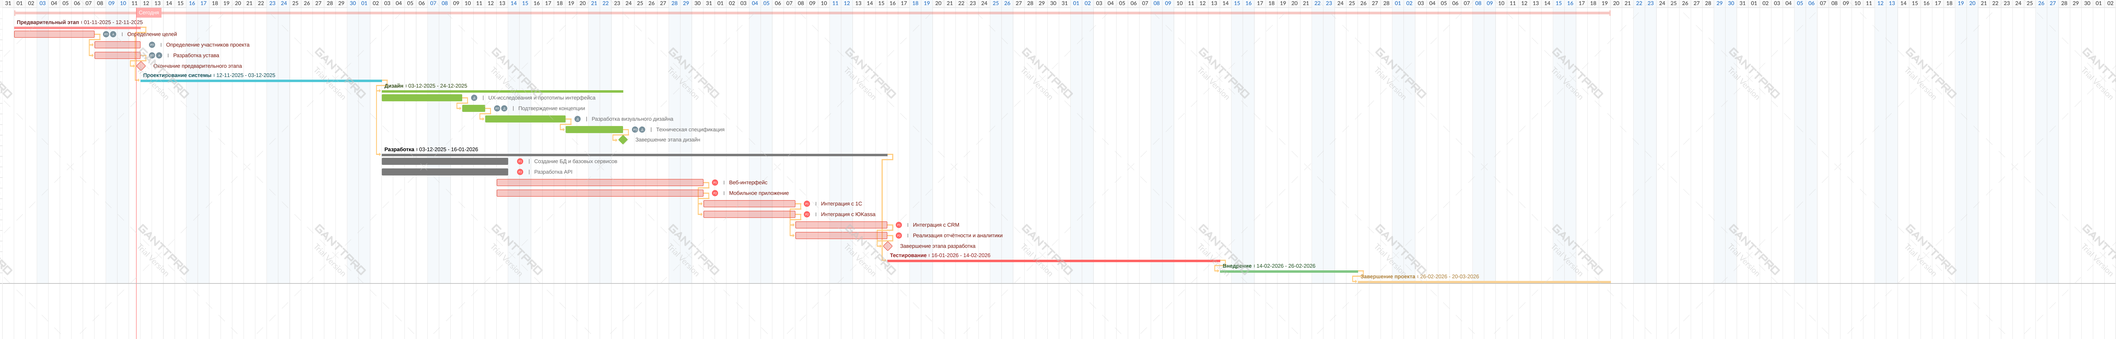
